# Hanover St Garage Restoration

Mon 8/5/24
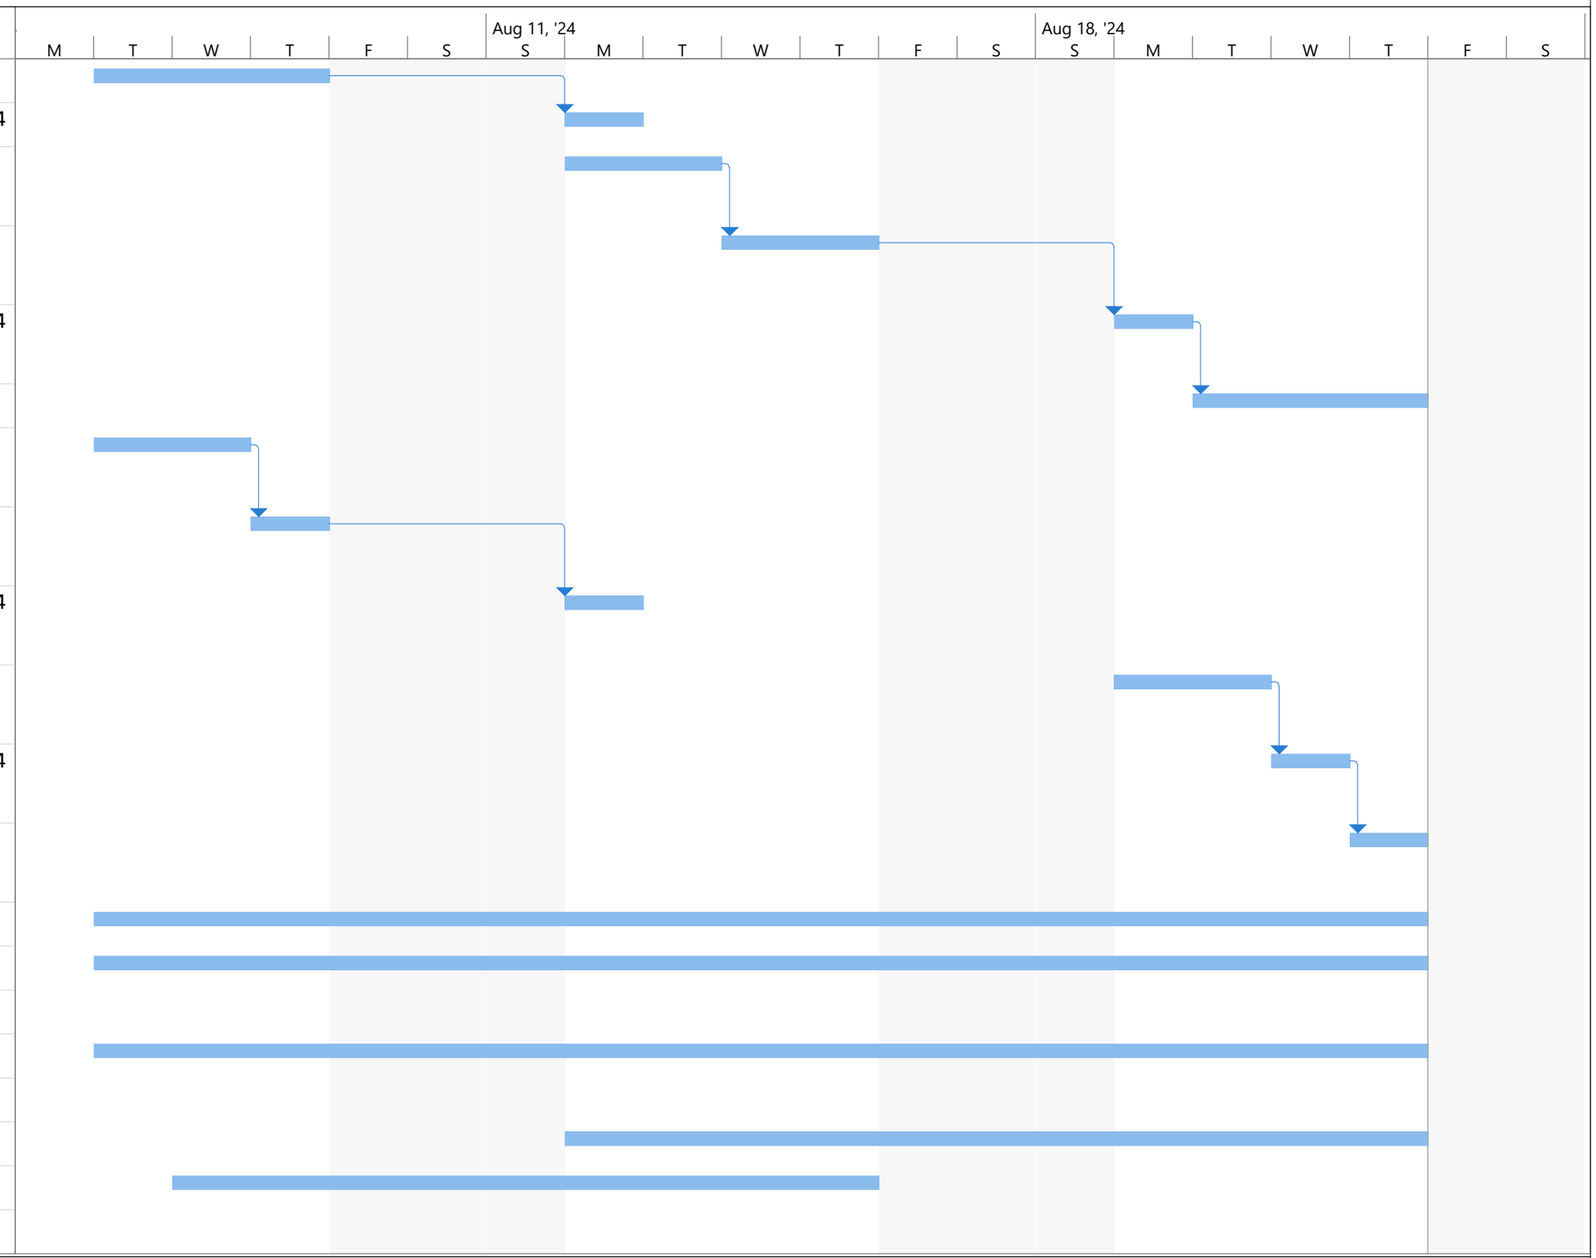
| ID | Task Name | Duration | Start | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Concrete Curing Period - Ramp 3/4 | 3 days | Tue 8/6/24 | Thu 8/8/24 |
| 2 | Ramp 3/4 - Remove Shoring | 1 day | Mon 8/12/24 | Mon 8/12/24 |
| 3 | Concrete Repairs - Ramp 2/3 - Demo (W.I. 3.1, 3.3, 3.6) | 2 days | Mon 8/12/24 | Tue 8/13/24 |
| 4 | Concrete Repairs - Ramp 2/3 - Rebar & Prep (W.I. 3.1, 3.3, 3.6) | 2 days | Wed 8/14/24 | Thu 8/15/24 |
| 5 | Concrete Repairs - Ramp 2/3 - Pour & Clean (W.I. 3.1, 3.3, 3.6) | 1 day | Mon 8/19/24 | Mon 8/19/24 |
| 6 | Concrete Curing Period - Ramp 2/3 | 3 days | Tue 8/20/24 | Thu 8/22/24 |
| 7 | Concrete Repairs - Underside Ramp 3/4 - Demo (W.I. 4.1, 4.2) | 2 days | Tue 8/6/24 | Wed 8/7/24 |
| 8 | Concrete Repairs - Underside Ramp 3/4 - Rebar & Prep (W.I. 4.1, 4.2) | 1 day | Thu 8/8/24 | Thu 8/8/24 |
| 9 | Concrete Repairs - Underside Ramp 3/4 - Pour & Clean (W.I. 4.1, 4.2) | 1 day | Mon 8/12/24 | Mon 8/12/24 |
| 10 | Concrete Repairs - Underside Ramp 2/3 - Demo (W.I. 4.1, 4.2) | 2 days | Mon 8/19/24 | Tue 8/20/24 |
| 11 | Concrete Repairs - Underside Ramp 2/3 - Rebar & Prep (W.I. 4.1, 4.2) | 1 day | Wed 8/21/24 | Wed 8/21/24 |
| 12 | Concrete Repairs - Underside Ramp 2/3 - Pour & Clean (W.I. 4.1, 4.2) | 1 day | Thu 8/22/24 | Thu 8/22/24 |
| 13 | Concrete Wash Repair (W.I. 3.7) | 11 days | Tue 8/6/24 | Thu 8/22/24 |
| 14 | Transition Concrete Repair | 11 days | Tue 8/6/24 | Thu 8/22/24 |
| 15 | | | | |
| 16 | Concrete Repairs - Level 4 (W.I. 3.1, 3.4, 3. | 11 days | Tue 8/6/24 | Thu 8/22/24 |
| 17 | | | | |
| 18 | Sealant Work - Garage Addition | 8 days | Mon 8/12/24 | Thu 8/22/24 |
| 19 | Expansion Joint - Level 3/4 Addition | 6 days | Wed 8/7/24 | Thu 8/15/24 |
| 20 | | | | |
